


HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKÏEMTJEGÅETIE

Desentralisert medisinutdanning på Helgeland

Prosjektleder Kaja Skjefstad

Forankring


HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKÏEMTJEGÅETIE

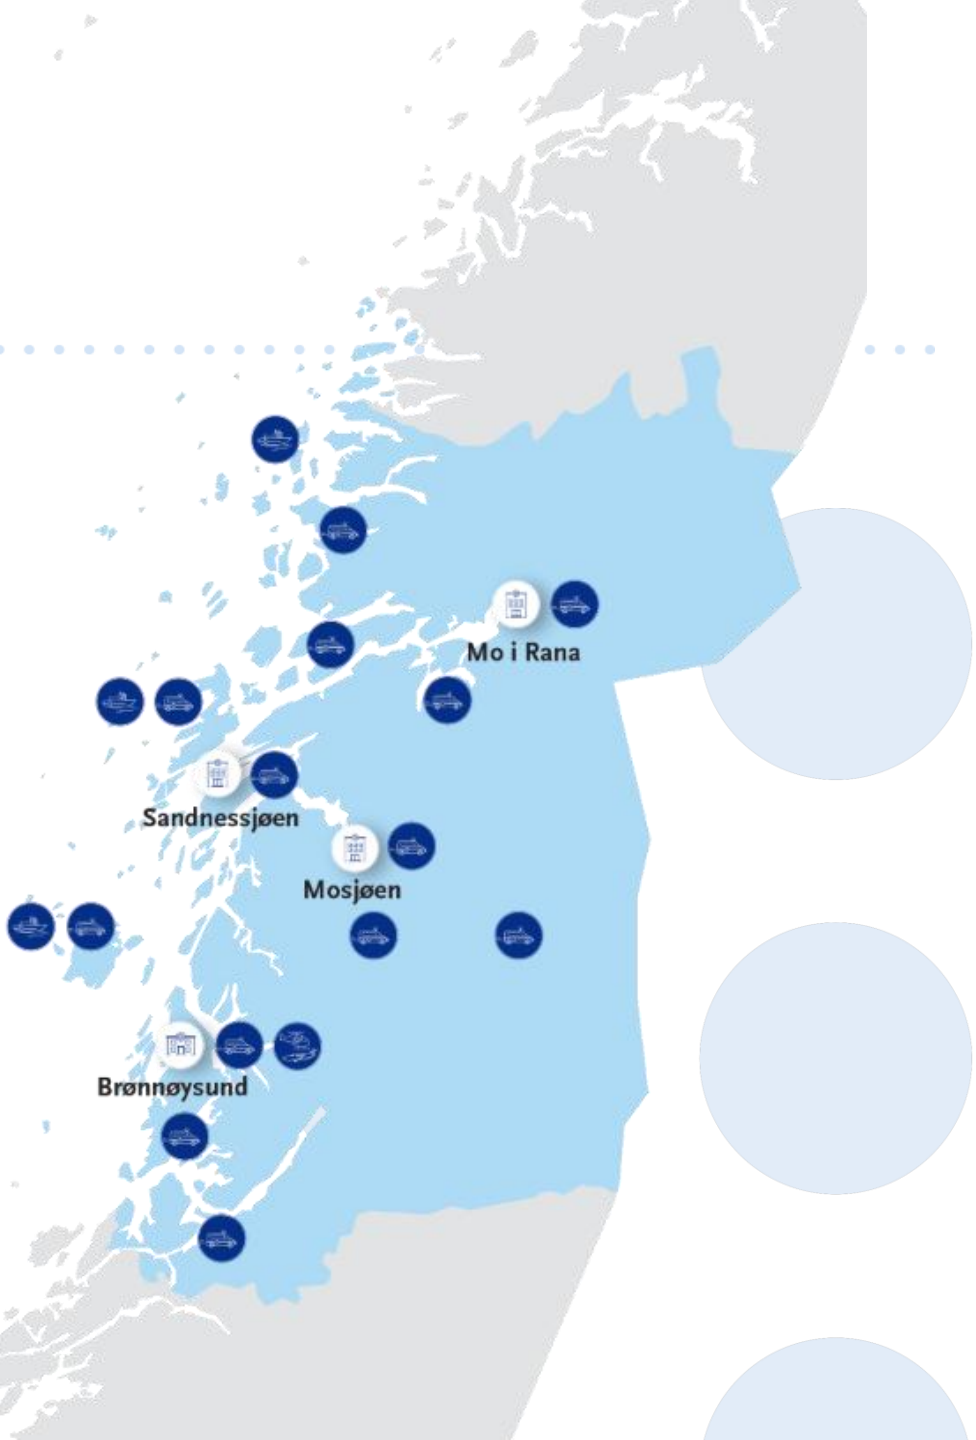


Styringsgruppa

Helgelandssykehuset	Kommunesektoren	
Administrerende direktør	Representant fra Rana kommune	Forslag foreligger
Medisinsk direktør	Representant fra Alstahaug kommune	Forslag foreligger
Klinikksjef kirurgisk klinikk	Representant fra Vefsn kommune	Forslag foreligger
Klinikksjef medisinsk klinikk		
Klinikksjef psykisk helse og rus		


Tidshorisont – desentralisert medisinutdanning

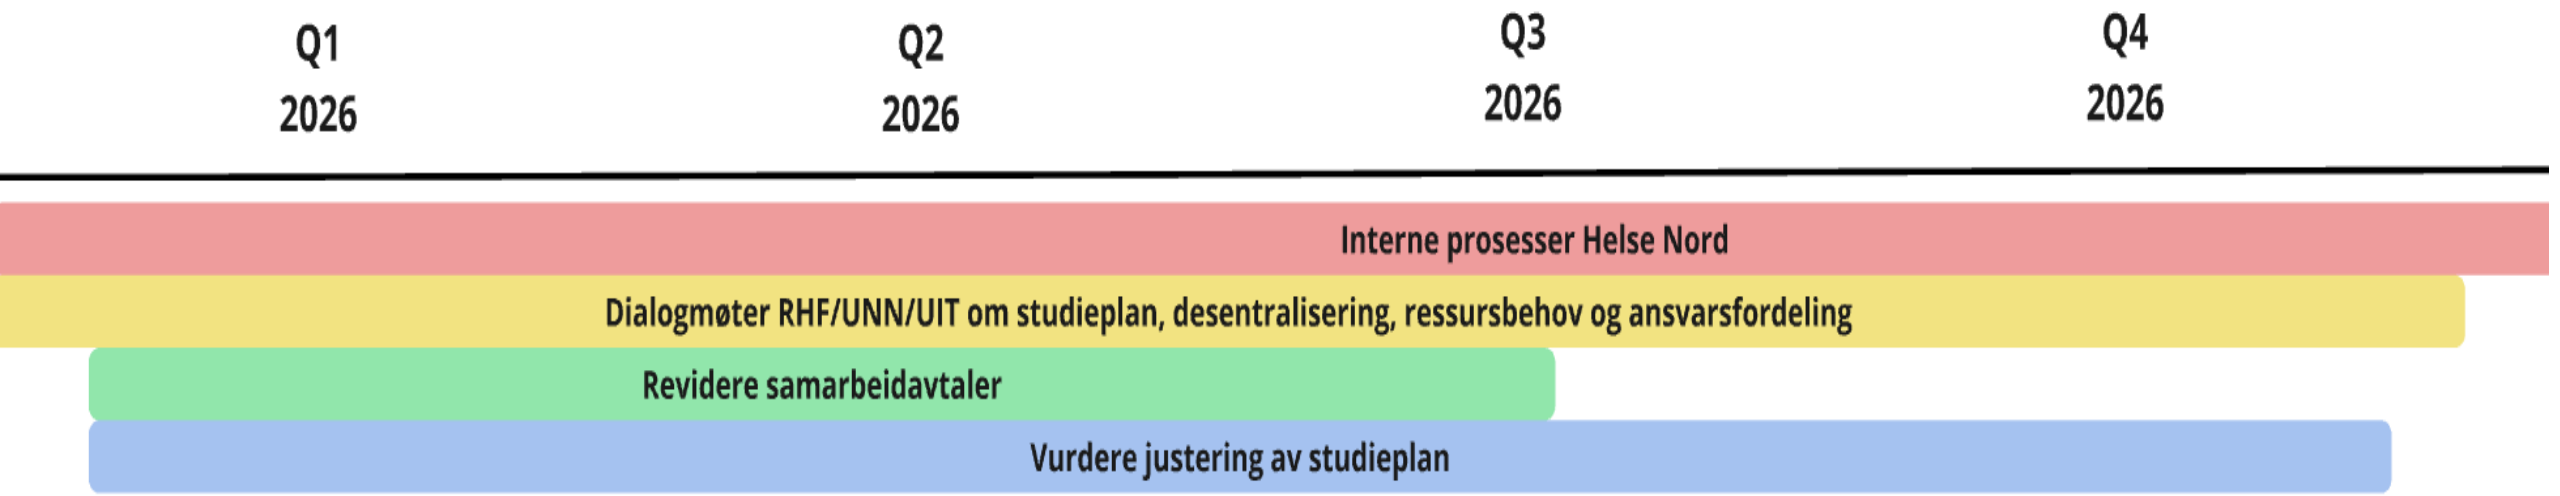


Tidshorisont

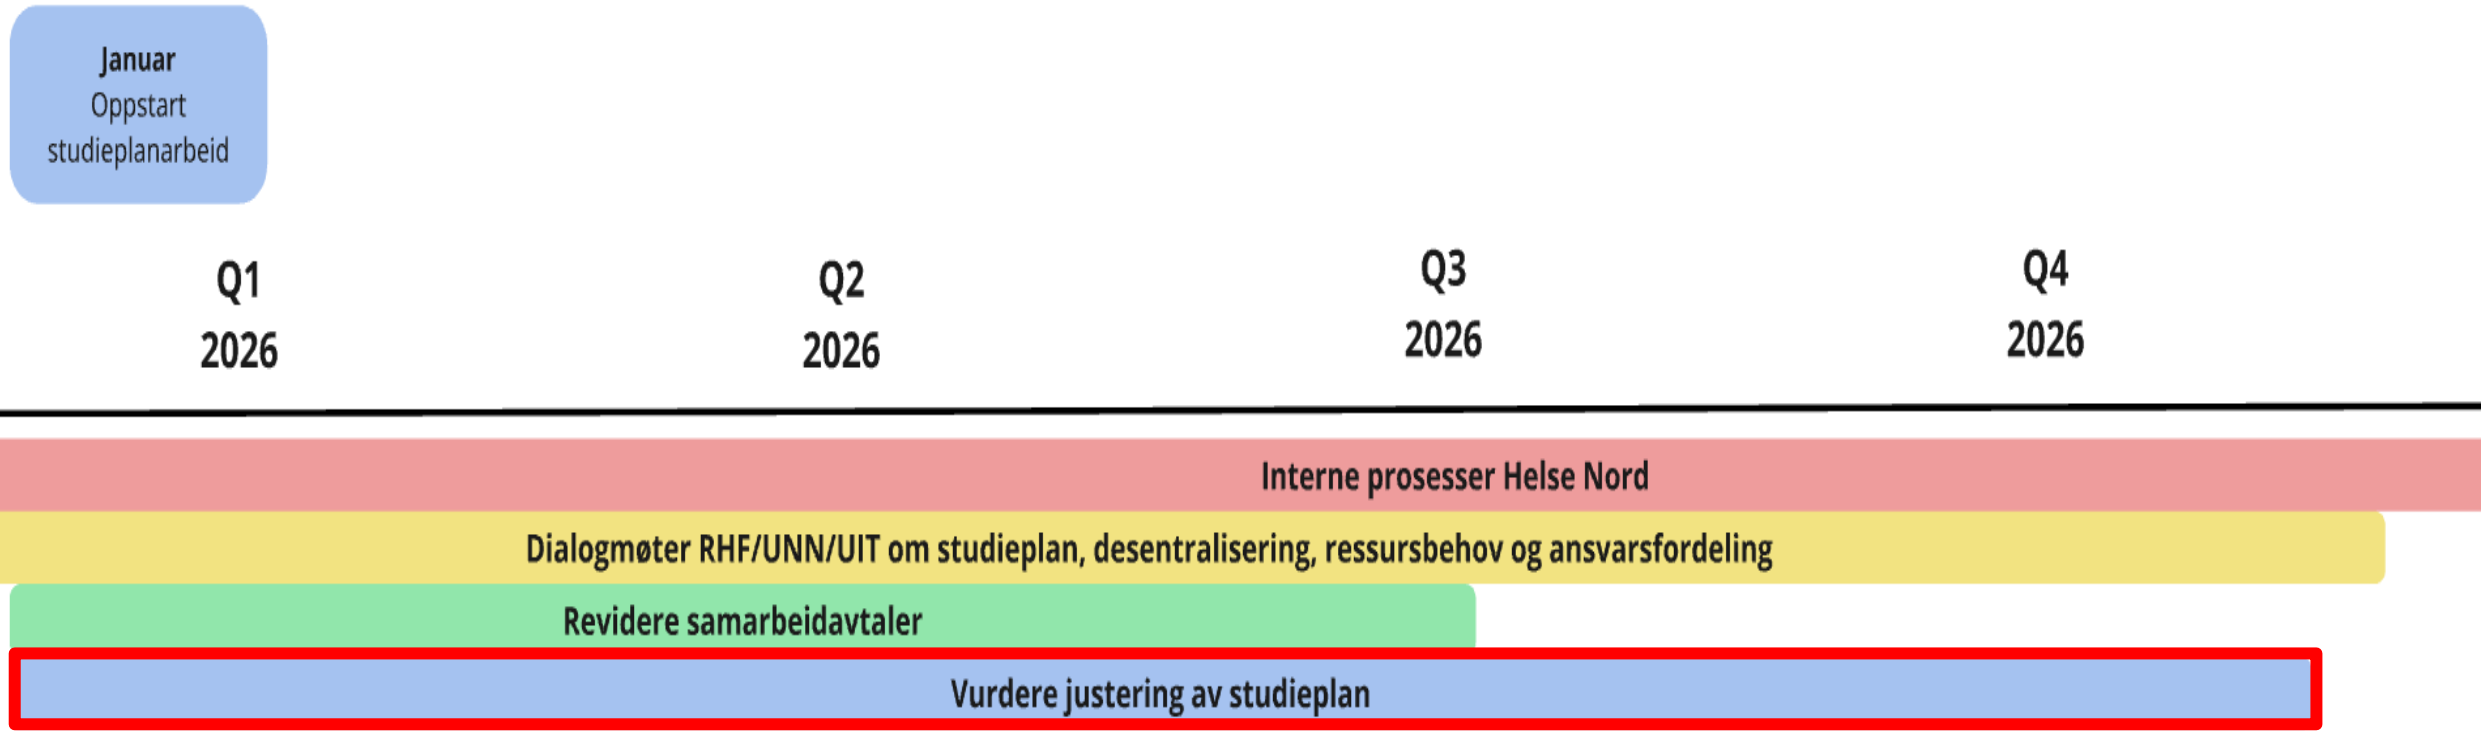


Tidshorisont

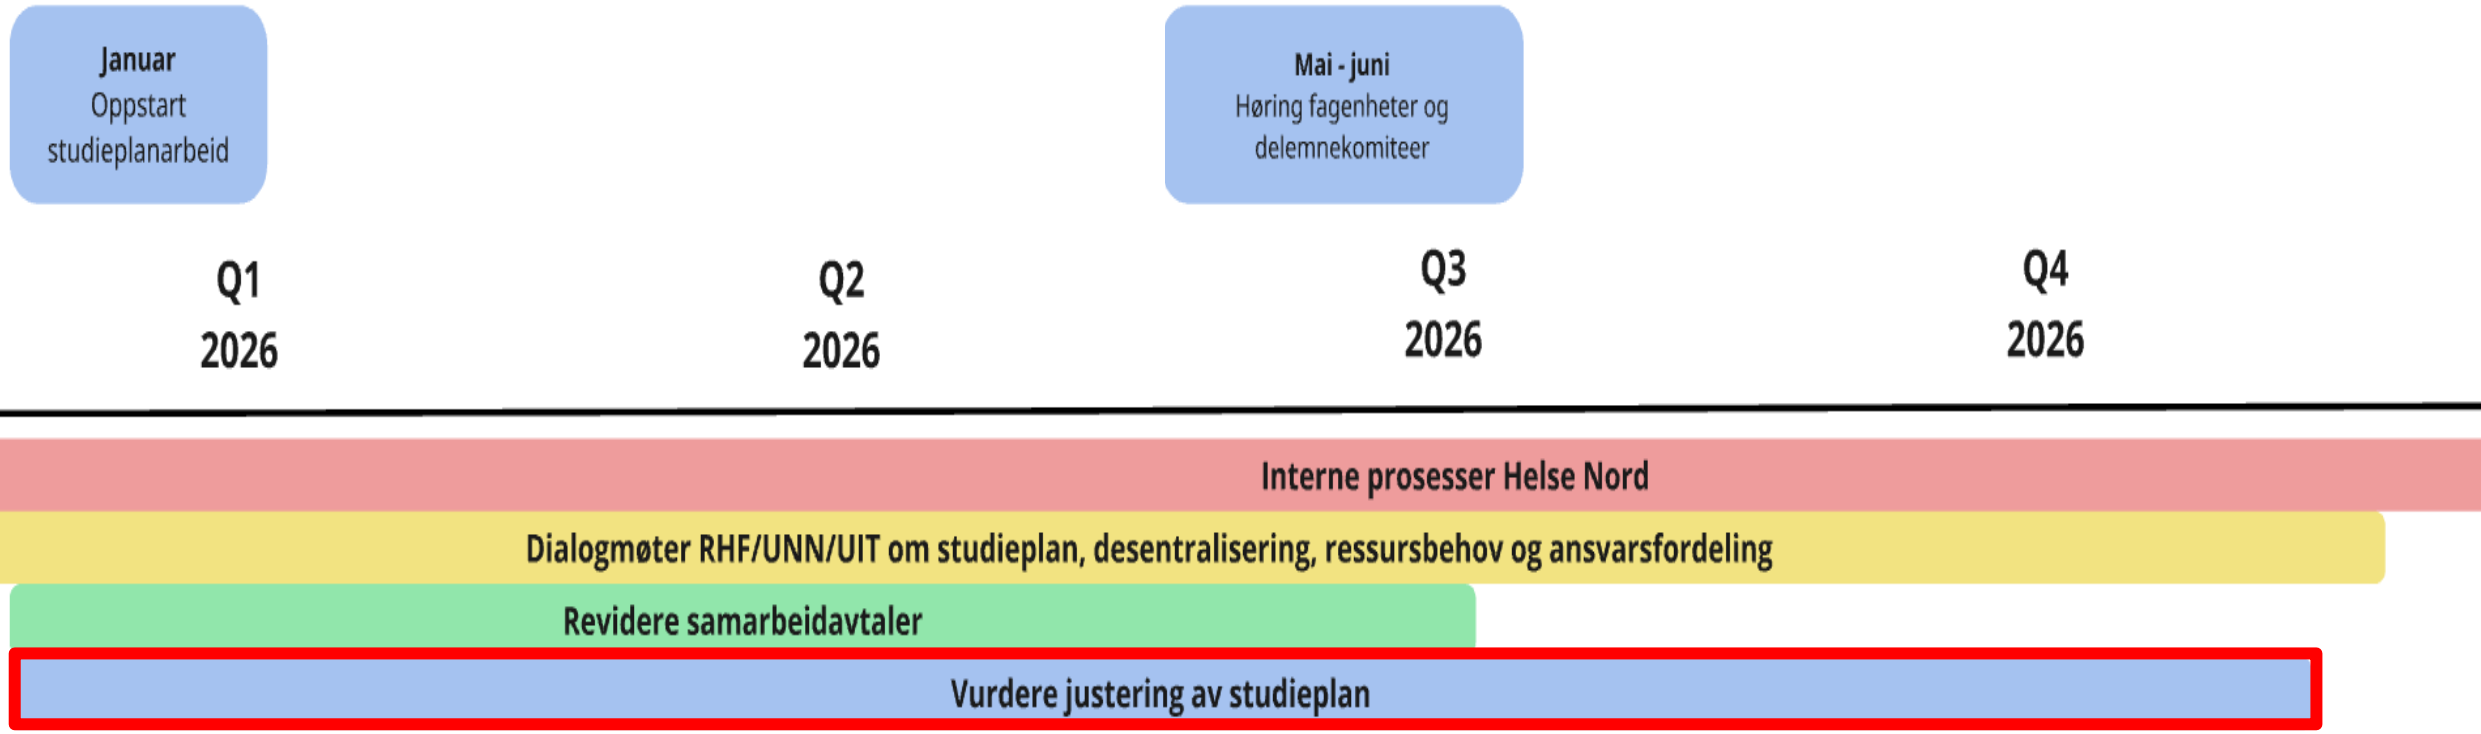

Tidshorisont

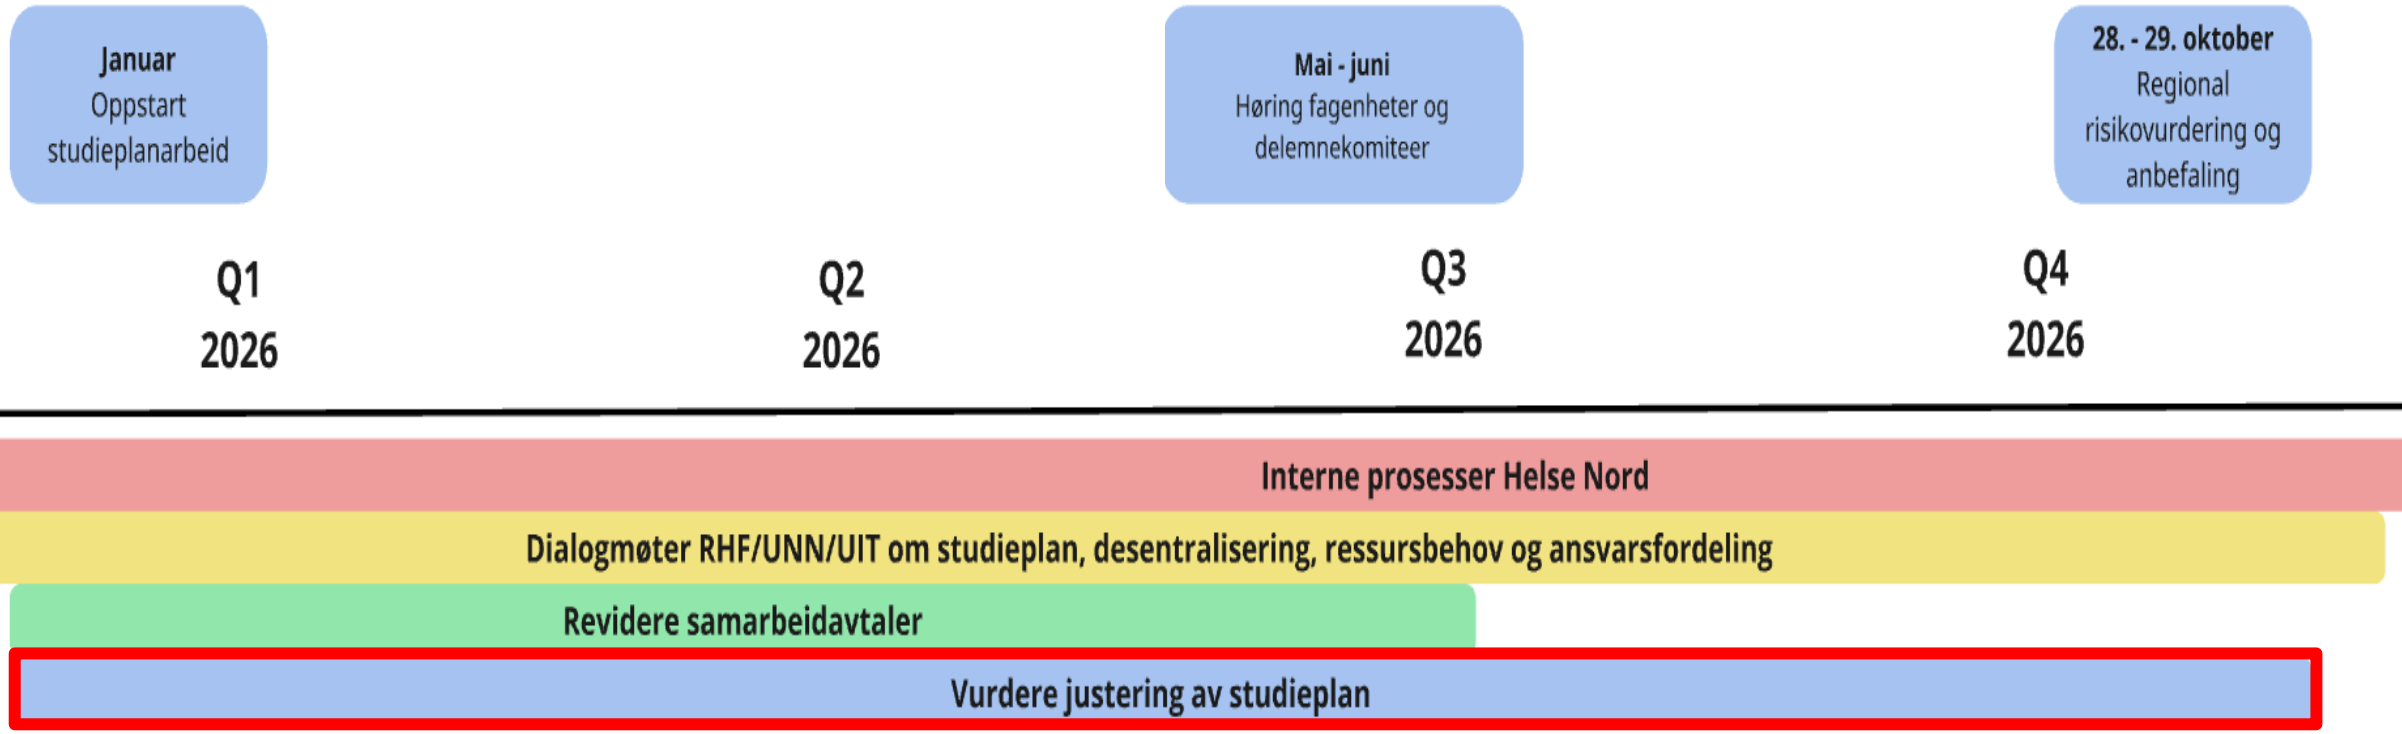

Tidshorisont

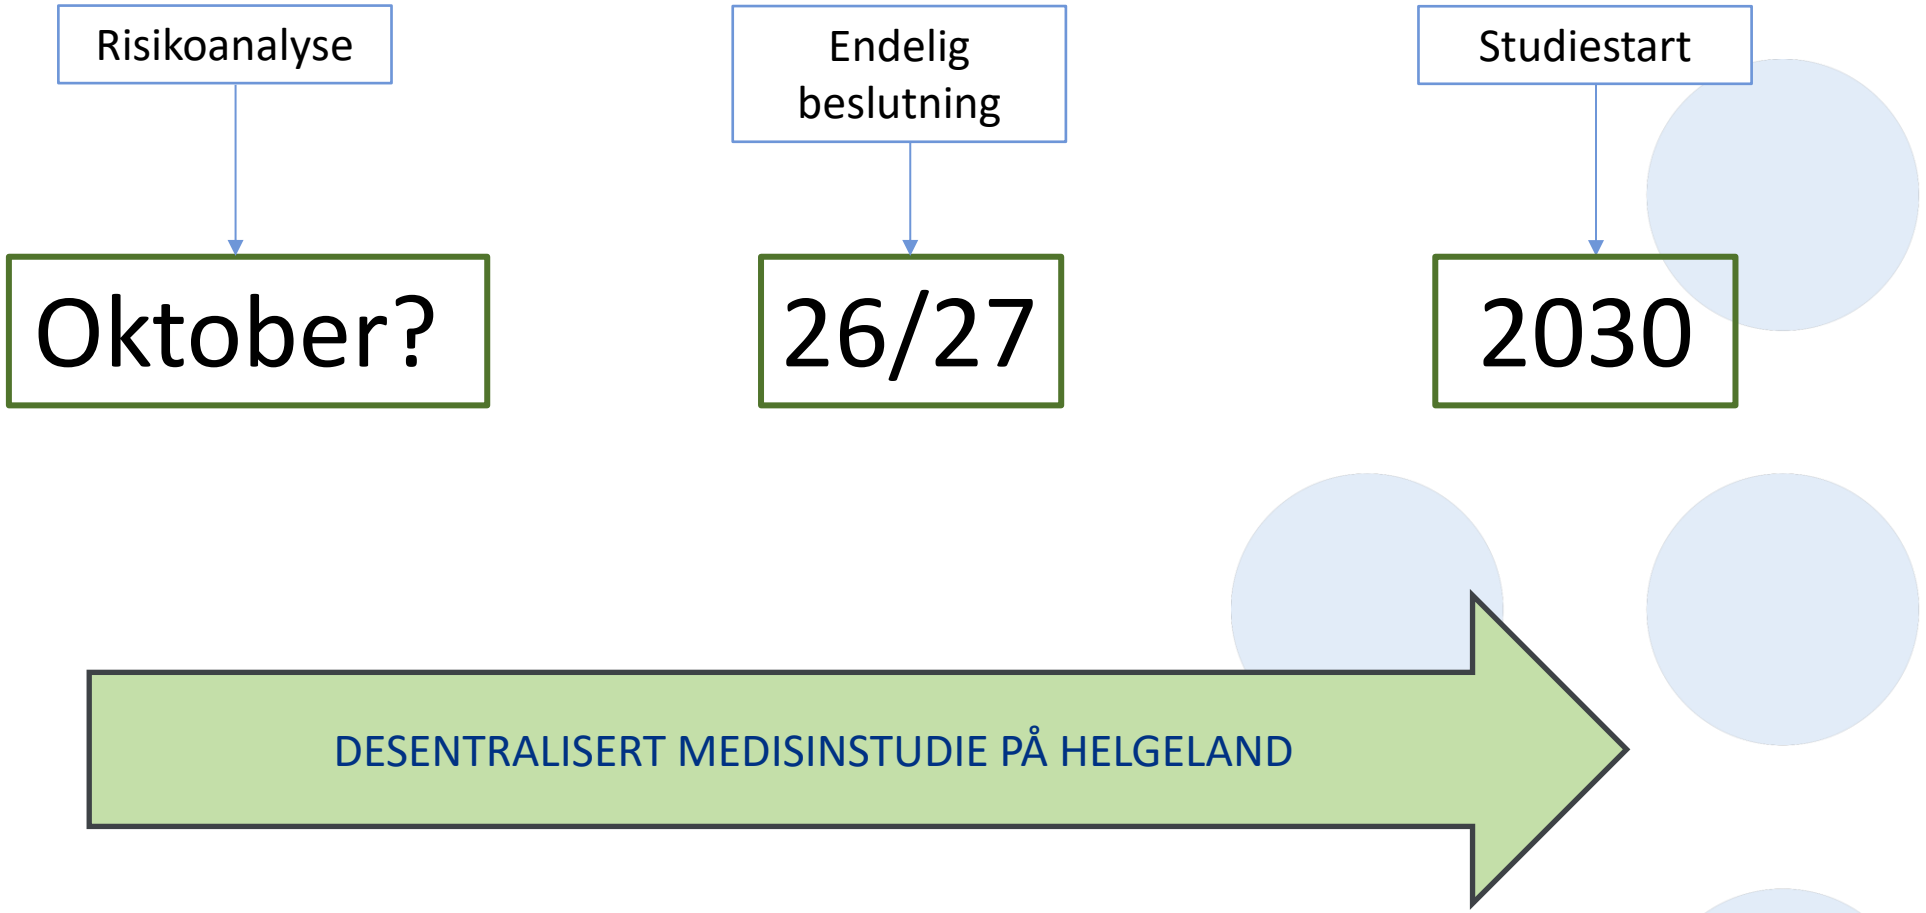

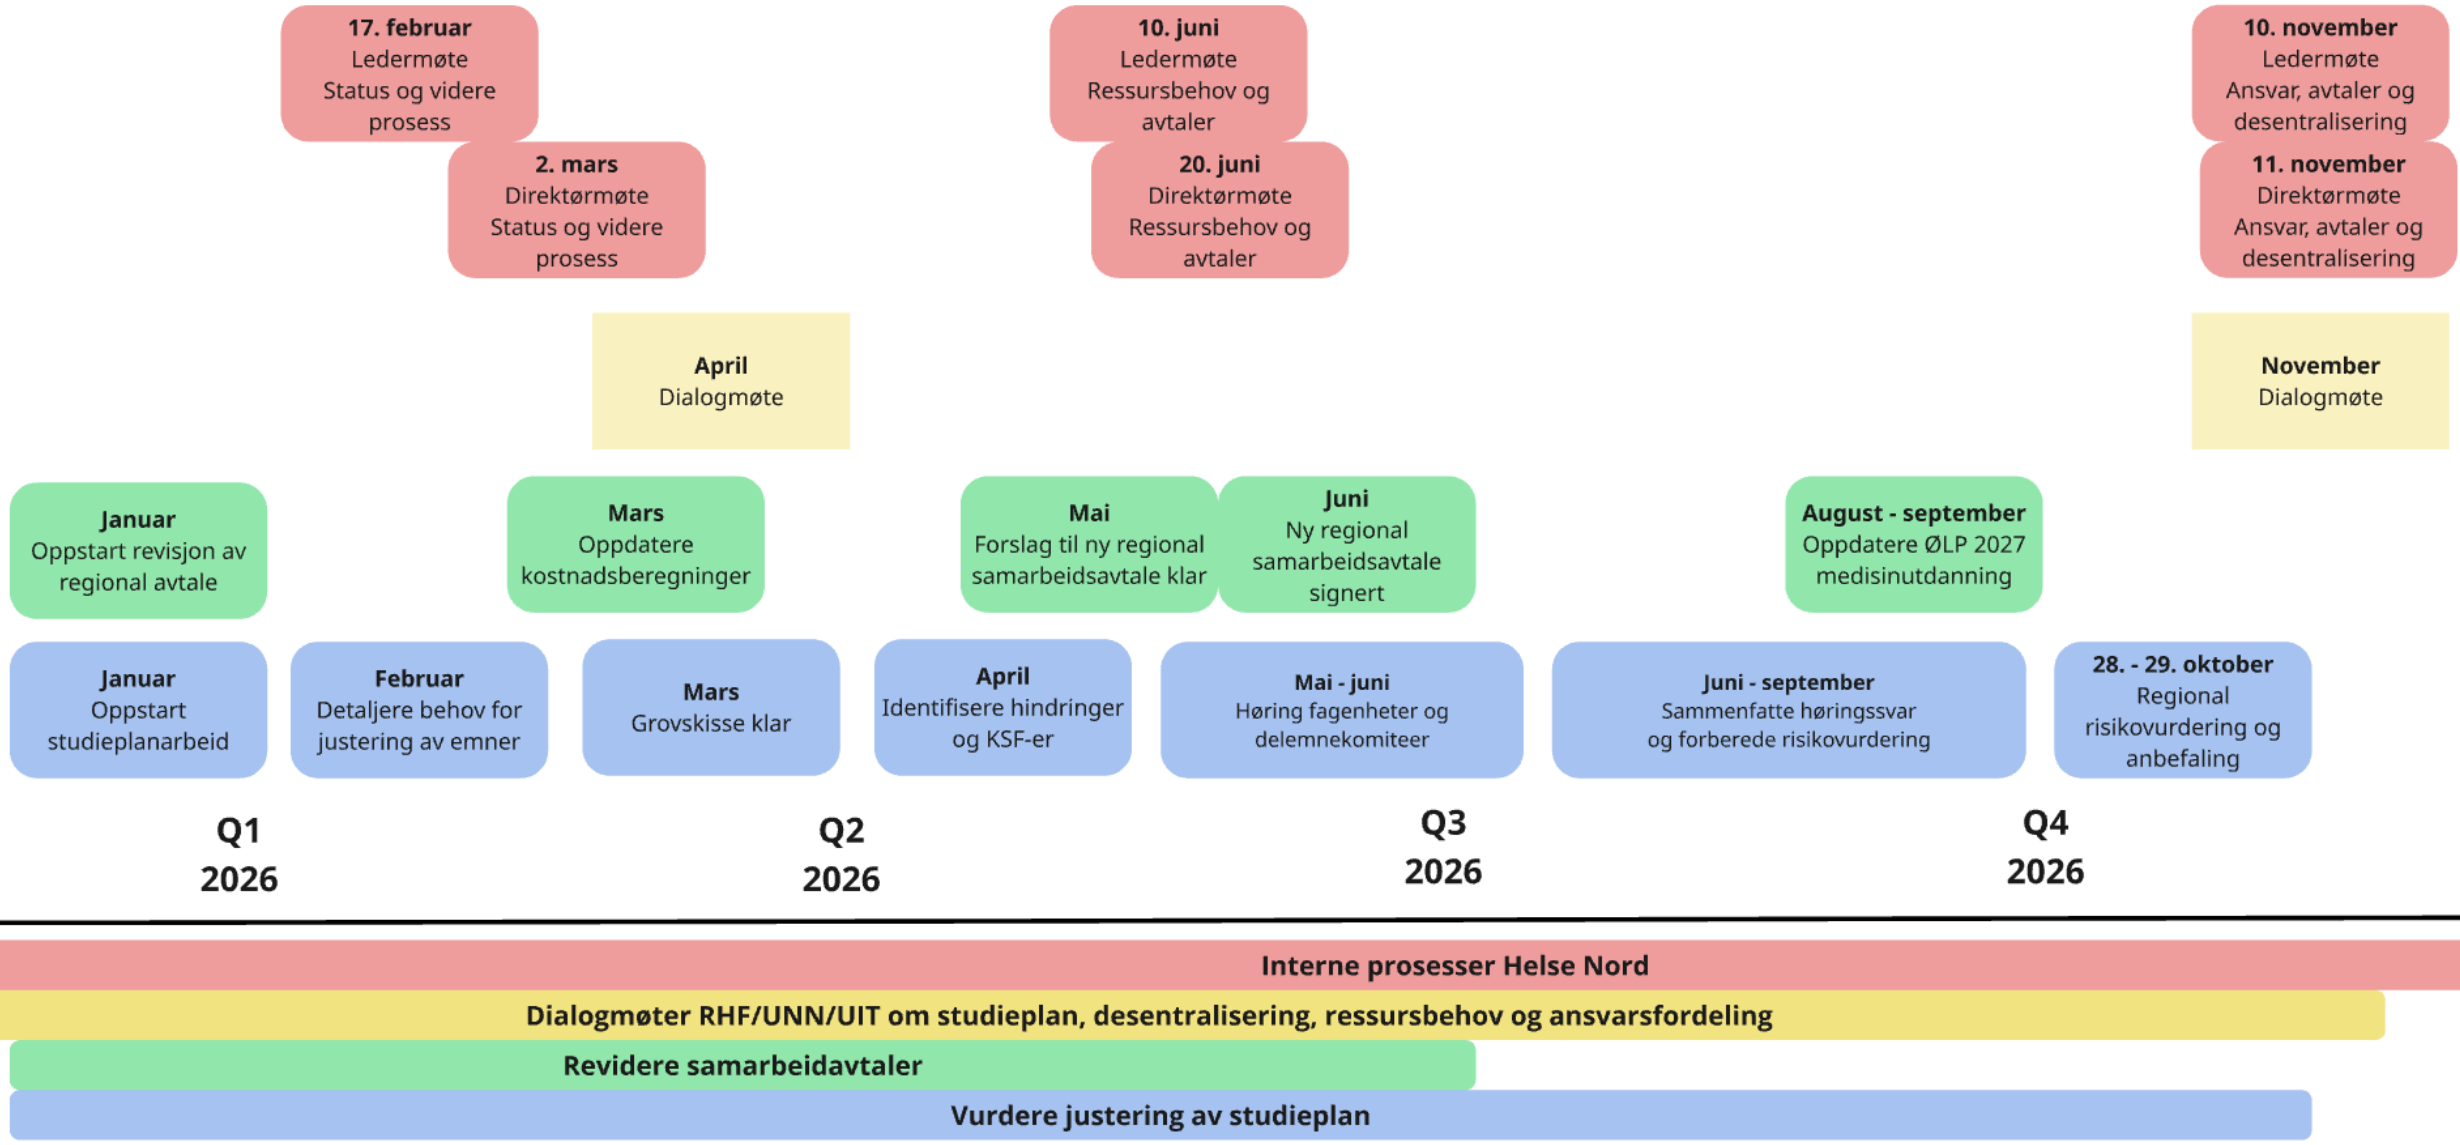
Helgeland som studiested



Foto: Helgelandssykehuset



Foto: Guro Toppen


17. februar
Ledermøte
Status og videre prosess
2. mars
Direktørmøte
Status og videre prosess
April
Dialogmøte
10. juni
Ledermøte
Ressursbehov og avtaler
20. juni
Direktørmøte
Ressursbehov og avtaler
10. november
Ledermøte
Ansvar, avtaler og desentralisering
11. november
Direktørmøte
Ansvar, avtaler og desentralisering
November
Dialogmøte
Januar
Oppstart revisjon av regional avtale
Mars
Oppdatere kostnadsberegninger
Mai
Forslag til ny regional samarbeidsavtale klar
Juni
Ny regional samarbeidsavtale signert
August - september
Oppdatere ØLP 2027 medisinutdanning
Januar
Oppstart studieplanarbeid
Februar
Detaljere behov for justering av emner
Mars
Grovskisse klar
April
Identifisere hindringer og KSF-er
Mai - juni
Høring fagenheter og delemnekomiteer
Juni - september
Sammenfatte høringssvar og forberede risikovurdering
28. - 29. oktober
Regional risikovurdering og anbefaling
Q1 2026
Q2 2026
Q3 2026
Q4 2026
Interne prosesser Helse Nord
Dialogmøter RHF/UNN/UIT om studieplan, desentralisering, ressursbehov og ansvarsfordeling
Revidere samarbeidavtaler
Vurdere justering av studieplan
